

**COMUNE DI PALERMO**  
(Prov. di Palermo)

**PROGETTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UN IMMOBILE SITO IN VIA  
MORSELLI N° 6 IN PALERMO**  
(Fg. 34, Part. 1134, Sub. 5 del N.C.E.U. di Palermo)

**COMMITTENTE:**

FONDO PENSIONI PER IL PERSONALE  
DELLA C.C.R.V.E.

**PROGETTAZIONE:**

ABGroup snc  
INGEGNERIA E SERVIZI TECNICI INTEGRATI

Ing. Cristiano Bilello

ORDINE DEGLI INGEGNERI  
della Provincia di Agrigento  
**Dott. Ing. CRISTIANO BILELLO**  
SCIACCA  
Iscritto al N. 1094 dell'Albo

**R 9**

**OGGETTO: CRONOPROGRAMMA**

**DATA: 30/05/2014**

**REVISIONE: 01**

**SPAZIO PER I VISTI:**




Nome attività	Durata	Settimana 1					Settimana 2					
		-2	-1	1	2	3	4	5	6	7		
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	2 g		Z1									
Allestimento dei servizi e dei depositi del cantiere	2 g							Z1				
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1 g									Z1		
Realizzazione di impianto elettrico e di messa a terra del cantiere	1 g										Z1	
Realizzazione di impianto idrico del cantiere	1 g										Z1	
Montaggio del ponteggio metallico fisso	10 g											
Montaggio di puntellatura per strutture	3 g											
Rimozione di ringhiere	1 g											
Rimozione di impianti	1 g											
Rimozione di pavimenti esterni	4 g											
Formazione di spianata di malta per esterni	3 g											
Impermeabilizzazione di coperture	1 g											
Posa di pavimenti su coperture piane	6 g											
Impermeabilizzazione di spazi esterni	1 g											
Posa di pavimenti su spazi esterni	2 g											
Sverniciatura e pulizia di ringhiere	1 g											
Verniciatura di ringhiere	1 g											
Montaggio di ringhiere	1 g											
Realizzazione di opere di lattoneria	1 g											
Rimozione di serramenti esterni	4 g											
Rimozione di lastre di marmo	1 g											
Rimozione di intonaci e rivestimenti esterni	10 g											
Ripristino di cls ammalorato di pilastri, travi, pareti	26 g											
Ripristino di cls di balconi e logge	12 g											
Posa di lastre di marmo	3 g											
Formazione intonaci esterni (tradizionali)	24 g											
Revisione e posa di serramenti esterni	9 g											
Smontaggio e Montaggio di scala in acciaio	2 g											
Trattamento protettivo delle superfici	10 g											
Smontaggio di puntellatura per strutture	3 g											
Smontaggio del ponteggio metallico fisso	10 g											
Smobilizzo del cantiere	1 g											
<b>LEGENDA Zona:</b>												





			Settimana 3					Settimana 4					Settimana 5									
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

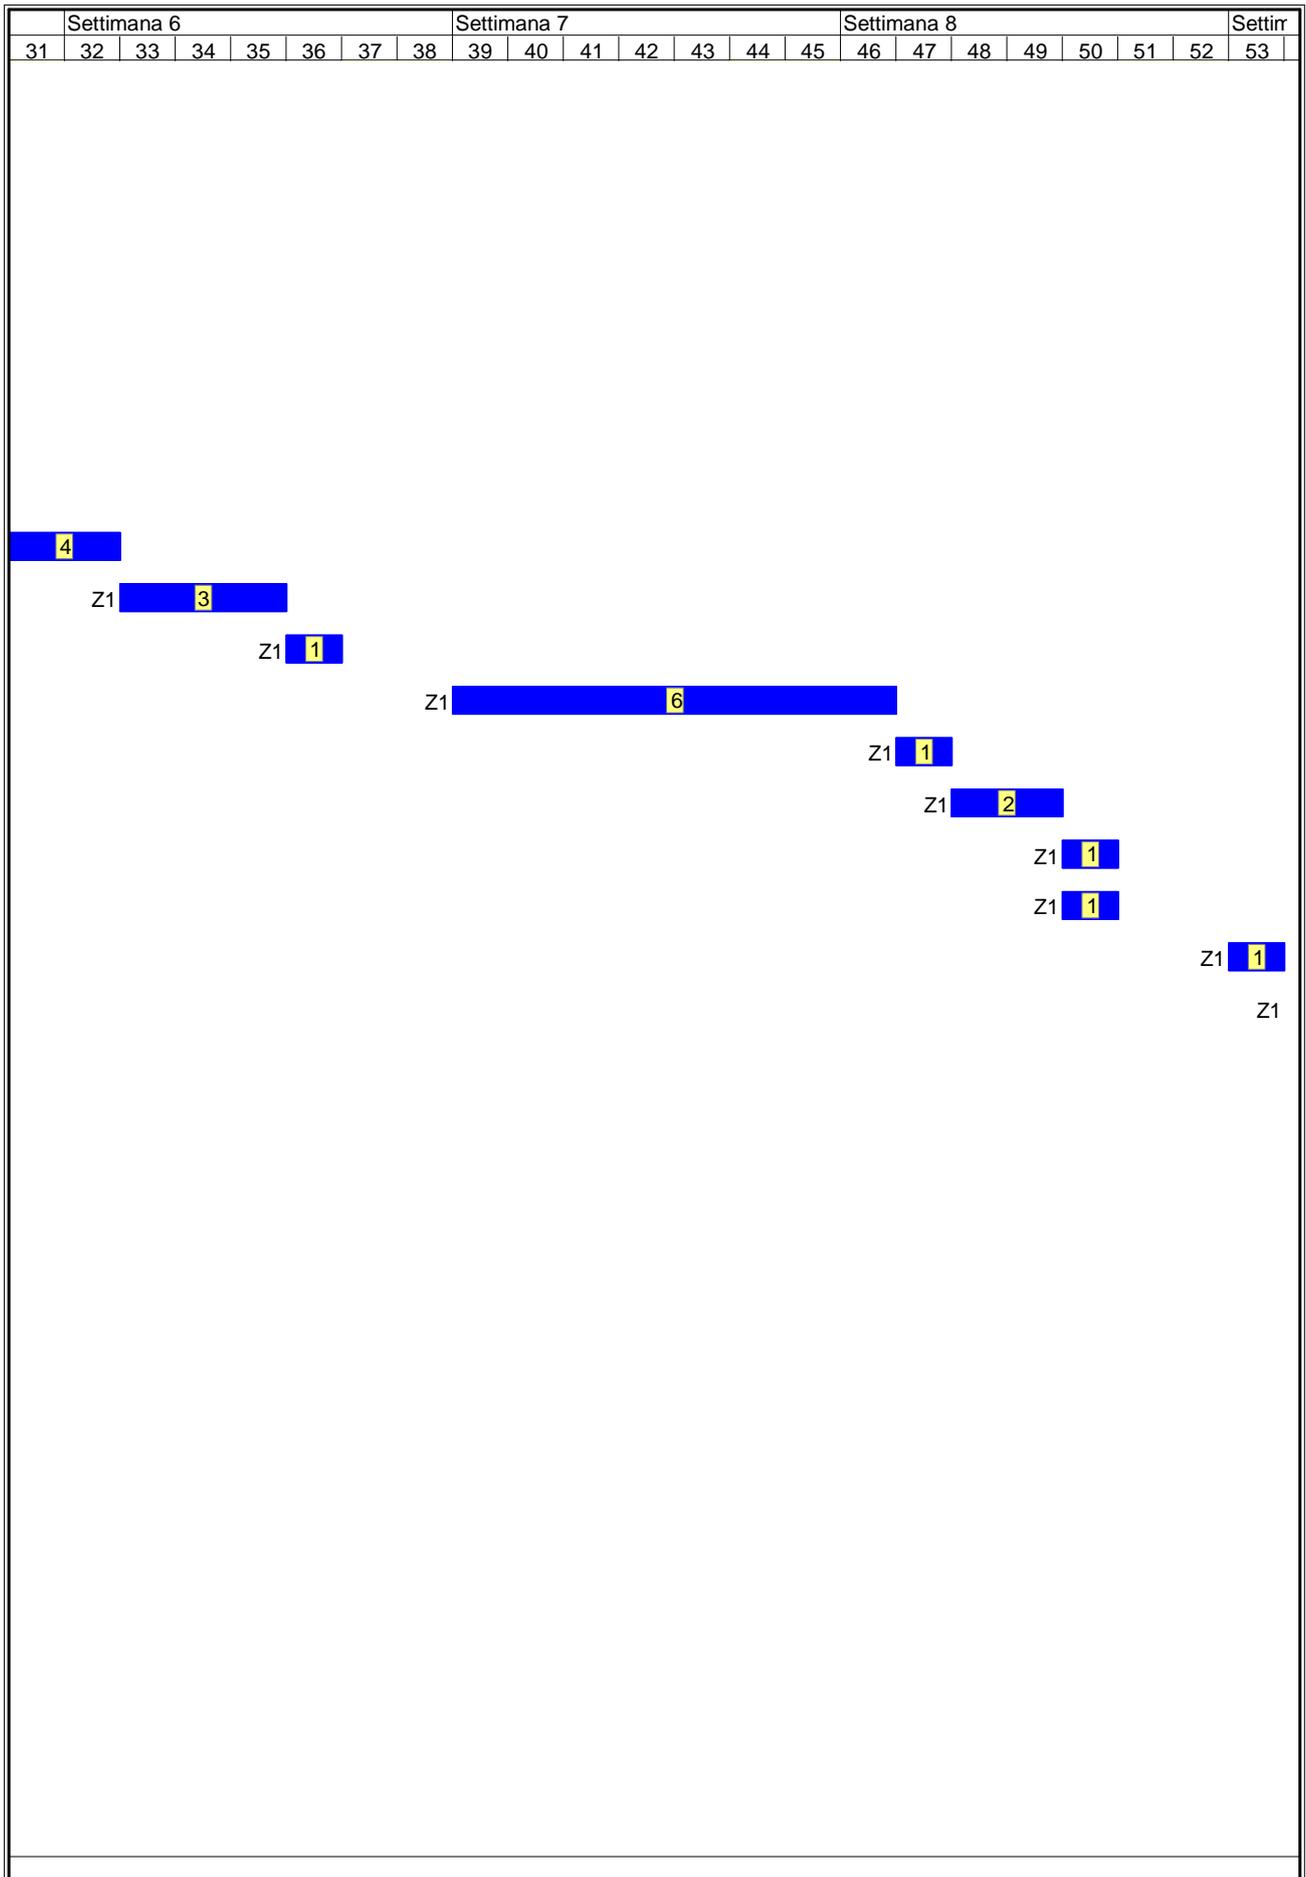

Settimana 6								Settimana 7							Settimana 8						Settir	
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53



Settimana 9						Settimana 10						Settimana 11						Settimana 12				
54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76

				Settimana 13							Settimana 14							Settimana 15						
77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99		
		10																						
				Z1	26																			

				Settimana 13							Settimana 14							Settimana 15				
77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99

		Settimana 16							Settimana 17							Settimana 18								
100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122		
										26														
		Z1												12										
																		Z1		3				

		Settimana 16							Settimana 17							Settimana 18							
100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	

Settimana 19							Settimana 20							Settimana 21							Settimana 2		
123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	
		3																					
		Z1	24																				

Settimana 19							Settimana 20							Settimana 21							Settimana 2	
123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145

22					Settimana 23							Settimana 24							Settimana 25				
146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	
					24																		
												Z1	9										

22					Settimana 23							Settimana 24							Settimana 25			
146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168

			Settimana 26						Settimana 27						Settimana 28							
169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191
<p>9</p> <p>Z1 2</p> <p>Z1 10</p>																						

			Settimana 26						Settimana 27						Settimana 28							
169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191

Settimana 29							Settimana 30							Settimana 31							Settir	
192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214
Z1	3																					
	Z1	10																				
																			Z1	1		

Settimana 29							Settimana 30							Settimana 31							Settir	
192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214
